



" Radost' pomáhat' "

Základná škola Sol'

Meno školy: Základná škola Sol' 53

Email školy: riaditel@zssol.edu.sk

Telefón: +421 574496324

Adresa školy: Sol' 53, 094 35 Sol'

Charakteristika projektového zámeru

Cieľom projektu bolo zlepšiť, skrášliť a rekultivovať prostredie školy tak, aby to malo čo najvýraznejší vplyv na kvalitu života žiakov. V praxi to znamenalo práce, ktoré nevyžadovali vysoko kvalifikovanú odbornú prácu a ktorú zvládli aj miestni dobrovoľníci, priatelia školy, či rodičia. Išlo o natieranie stien, úpravu a skrášlenie školského interiéru.

Hlavným zámerom tohto projektu bolo integrovať pomoc dobrovoľníkov pri vytvorení oddychovej a relaxačnej zóny pre žiakov v priestoroch chodby na II. poschodí, kde by mohli tráviť čas počas dlhých prestávok.

Na prázdnu chodbu školy bolo vytvorené sedenie z paliet a použili sa dve vyradené lavičky. Sedenie a lavičky sú doplnené ušitými epedami a zástenami. Pestrosť sedenia farebne korešponduje s náterom a maľbami na stenách.

Samotné maľby výtvarne zobrazujú cestu vlakom z domovskej obce Soľ do Bratislavy a späť naprieč celým Slovenskom mestami: Bratislava, Trnava, Poprad.... Motívy vlakov ŽSR sú prerušované informáciami o jednotlivých mestách, ktoré zahŕňujú vlajku a erb mesta, geografické vyobrazenie mesta na mape Slovenska a stručnú charakteristiku. Medzi jednotlivými mestami sú piktogramy znázorňujúce turistické zaujímavosti SR - hrady, zámky, kúpele, jaskyne, letiska, skanzeny, ZOO, divadlá, botanické záhrady, aquaparky, vodné nádrže a pohoria. Žiaci tak majú možnosť spoznávať Slovensko jednoduchou, zábavnou a nenásilnou formou.

Identifikáciu prác s časovými termínmi (detailný popis so zdôvodnením)

Postup realizácie by sa chronologicky dá zhrnúť do týchto nasledovných krokov:

1. Termín predloženia projektu: 1. apríl 2016
2. Schválenie projektu a vyrozumenie subjektu grantovou komisiou: 8. apríl 2016
3. Termín fyzickej realizácie a odovzdania prác do 30. júna 2016, vrátane vyúčtovania (emailom či poštou).

Časový plán:

1. 11. - 14.04. 2016 (4 prac. dni)
Príprava vizualizácie a stretnutie zainteresovaných dobrovoľníkov za účelom informovanosti a vzájomných konzultácií o prácach.
2. 18. - 6.05. 2016 (15 prac. dní)
Kúpa materiálu, príprava, úprava a maľovanie stien. Šitie a plnenie vnútorných vankúšov.
3. 9. - 27.05. 2016 (15 prac. dní)
Kúpa materiálu, tvorba, laminovanie a montáž informácií o mestách v priestore chodby, výroba sedenia z paliet - brúsenie, rezanie, šitie návlekov na epedá a vankúše.
4. 30.05. - 15.06.2016 (13 prac. dní)
Kúpa potrebného materiálu, výroba šablón, aplikácia piktogramov na steny, výroba sedenia z paliet - morenie, lakovanie a montáž, plnenie epied a návlekov vnútornými vankúšmi.
5. 16. - 24.06. 2016 (7 prac. dní)
Dekorovanie stien maľbami prírody, detí, vlakov a koľajníc, vylepovanie nápisov/ názvov k jednotlivým piktogramom.
6. 27. - 29.06. 2016 (3 prac. dni)
Dokončenie priestoru osadením a montážou sedenia. Odovzdanie prác vrátane vyúčtovania.

Spolu: 57 pracovných dní

Projekt koordinoval riaditeľ ZŠ Soľ - PaedDr. Pavol Hybala a učiteľia - Mgr. Júlia Babicová, Mgr. Katarína Mihalčinová.

Plán využitia dobrovoľníkov

- počet -8

- spôsob integrácie :


Dobrovoľníci pomáhali pri výrobe a úprave stien, maľbe a výrobe nábytku, výrobe dekorácií a to 5 hod./denne, z toho 3 hodiny na mieste a 2 hodiny doma podľa uvedeného časového plánu.

Definícia plánu na osobnú aktivitu dobrovoľníkov

Hlavnou činnosťou dobrovoľníkov bolo premaľovanie pôvodného náteru stien v priestore, úprava, maľovanie a inštalácia dekorácií na steny, zhotovenie sedenia, šitie sedákov a zásten.

Oproti pôvodnému projektovému zámeru neboli zhotovené taurety z pneumatík a vysadené rastliny vzhľadom na finančné prostriedky a časovú náročnosť prác. Tieto komponenty budú postupne financované a doplnené podľa možnosti z vlastných zdrojov školy.

Pôvodné priestory

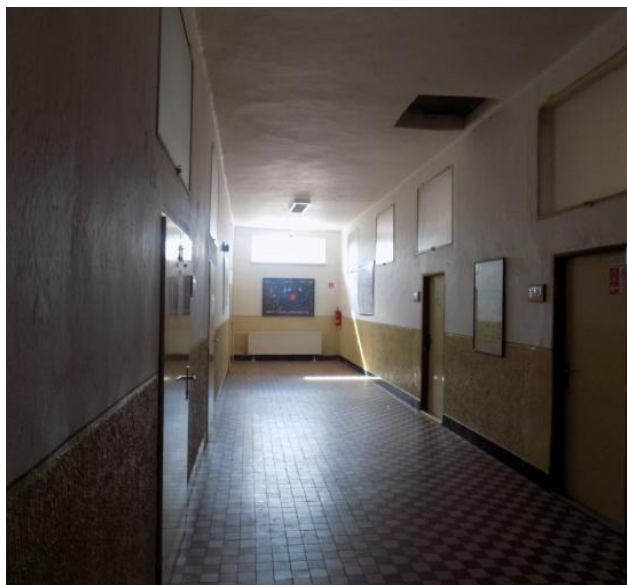

Realizácia projektu a upravené priestory

